新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

10月度　月間工程表

1/1

No.03

作成日:2019年 8月20日
修正日:2019年 9月20日

工期（契約工期）	当該工事工期
着工 : 2019年 7月 5日	2019年10月 1日
竣工 : 2020年12月25日	2019年10月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月：10月

日：1 火 / 2 水 / 3 木 / 4 金 / 5 土 / 6 日 / 7 月 / 8 火 / 9 水 / 10 木 / 11 金 / 12 土 / 13 日 / 14 月 / 15 火 / 16 水 / 17 木 / 18 金 / 19 土 / 20 日 / 21 月 / 22 火 / 23 水 / 24 木 / 25 金 / 26 土 / 27 日 / 28 月 / 29 火 / 30 水 / 31 木

AM PM

行事予定

- 安全大会
- 定例会議
- 全休
- 定例会議
- 全休
- 定例会議
- 全休
- 11月度 安全衛生協議会
- 全休
- 総合定例会議

仮設工事

- 仮設道路整備
- 120tｸﾚｰﾝ組立
- 120tｸﾚｰﾝ
- 構台敷設
- 120tｸﾚｰﾝ
- 構台敷設
- 120tｸﾚｰﾝ
- ﾀｲﾔ洗浄機撤去工事
- 120tｸﾚｰﾝ

揚重機等

- 掘削重機(0.7x2～4台)、ﾀﾞﾝﾌﾟ
- 掘削重機(0.7x2～4台)、ﾀﾞﾝﾌﾟ
- 掘削重機(0.7x2～4台)、ﾀﾞﾝﾌﾟ
- ｾﾊﾟ受けｱﾝｸﾞﾙ設置 Ⅰ工区
- ｾﾊﾟ受けｱﾝｸﾞﾙ設置 Ⅰ工区

基礎鉄筋工事

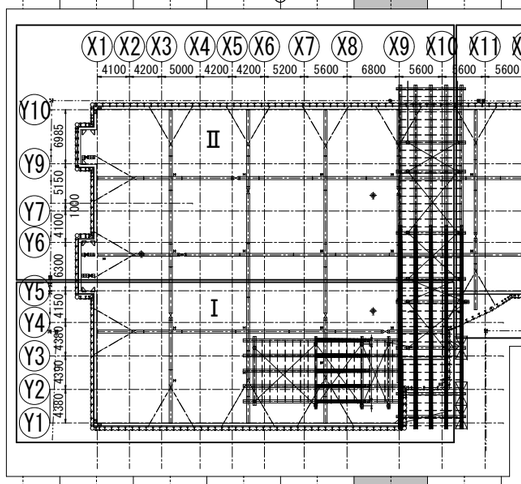

- Ⅲ工区
- ｾﾊﾟ受けｱﾝｸﾞﾙ設置 Ⅱ工区
- ｾﾊﾟ受けｱﾝｸﾞﾙ設置 Ⅱ工区 Ⅲ工区
- ｾﾊﾟ受けｱﾝｸﾞﾙ設置 Ⅲ工区
- 鉄筋受け架台設置
- 基準墨出し Ⅲ工区
- Ⅱ工区
- 基礎梁・耐圧盤配筋 Ⅱ工区：基礎梁85.1t+耐圧48.6t 133.7t=1.0t/人・d x12人 x11d
- 鉄筋受け架台設置 Ⅱ工区
- 基準墨出し Ⅱ工区
- Ⅰ工区
- ﾍﾞｰｽCON Ⅰ工区：290m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台
- ﾋﾟｯﾄ枠 CON止め Ⅰ工区
- 基準墨出し
- 基礎梁・耐圧盤配筋 Ⅰ工区：基礎梁67.1t+耐圧38.3t 105.4t=1.0t/人・d x8人 x13d
- 鉄筋受け架台設置 Ⅰ工区
- 基礎梁・耐圧盤配筋 Ⅰ工区：基礎梁67.1t+耐圧38.3t 105.4t=1.0t/人・d x8人 x13d
- 地中梁型枠 Ⅰ工区：基礎梁761m2 761m2=12m2/人・d x8人 x8d
- 基準墨出し

山留工事

- 切梁架け Ⅱ工区 Ⅲ工区
- 切梁架け Ⅱ工区 Ⅲ工区
- 構台敷設
- 構台敷設

土工事

- 捨てCON Ⅰ工区:780m2
- 2次掘削 Ⅰ工区:2,670m3 x9d 8,900m3 300m3/dx30d
- 2次掘削 Ⅱ工区:3,380m3 x11d 8,900m3 300m3/dx30d
- 2次掘削 Ⅱ工区:3,380m3 x11d 8,900m3 300m3/dx30d
- 捨てCON Ⅱ工区:1,060m2
- 2次掘削 Ⅱ工区:3,380m3 x11d 8,900m3 300m3/dx30d
- 2次掘削 Ⅲ工区:2,850m3 x10d
- 捨てCON Ⅲ工区:900m2
- 1次掘削 Ⅱ工区:3,250m3 x9d
- 残土搬出
- 1次掘削 Ⅲ工区:2,750m3 x8d 8,600m3 330m3/dx26d h=3.0
- 1次掘削 Ⅲ工区:2,750m3 x8d
- 残土搬出
- 2次掘削 Ⅲ工区:2,850m3 x10d 8,900m3 300m3/dx30d
- 残土搬出
- 2次掘削 Ⅲ工区:2,850m3 x10d 8,900m3 300m3/dx30d
- 残土搬出

検査・立会

- 配筋検査 Ⅰ工区地中梁・耐圧盤

施工図

施工計画書
