新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

11月度　月間工程表

1/1

No.04

作成日:2019年10月 7日
修正日:2019年10月15日

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2019年11月 1日
竣工：2020年12月25日	2019年11月30日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森
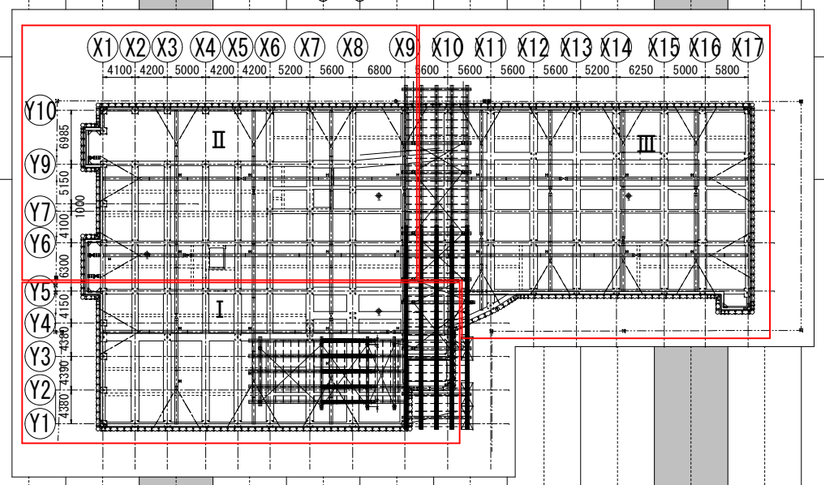
月	11月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM
行事予定	安全大会		全休		定例会議					全休		定例会議					全休	安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	定例会議		12月度 安全衛生協議会		土閉	全休		定例会議					全休
仮設工事 揚重機等																															
基礎躯体工事 Ⅲ工区	捨てCON Ⅲ工区 900m2	基準墨出し		鉄筋受け架台設置 Ⅲ工区		基礎梁・耐圧盤配筋 Ⅲ工区：基礎梁71.7t+耐圧40.9t 112.6t=1.0t/人・d x10人 x11d						基礎梁・耐圧盤配筋		Ⅲ工区：基礎梁71.7t+耐圧40.9t 112.6t=1.0t/人・d x10人 x11d					基礎梁・耐圧盤配筋	ﾋﾟｯﾄ枠	ﾍﾞｰｽCON Ⅲ工区：310m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台		Ⅲ工区 歩廊足場組立		地中梁型枠		Ⅲ工区：基礎梁811m2 811m2=12m2/人・d x11人 x6d			打設足場架		地中梁CON Ⅲ工区：459m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台		
基礎躯体工事 Ⅱ工区						基礎梁・耐圧盤配筋		Ⅱ工区：基礎梁85.1t+耐圧48.6t 133.7t=1.0t/人・d x12人 x11d		ﾋﾟｯﾄ枠 CON止め Ⅱ工区		ﾍﾞｰｽCON Ⅱ工区：500m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	Ⅱ工区 歩廊足場組立	基準墨出	地中梁型枠	Ⅱ工区：基礎梁963m2 963m2=12m2/人・d x10人 x8d				地中梁型枠	Ⅱ工区：基礎梁963m2 963m2=12m2/人・d x10人 x8d		打設足場架 CON止め Ⅱ工区	打設足場払 地中梁CON Ⅱ工区：300m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	歩廊足場解体 Ⅱ工区 地中梁型枠解体 Ⅱ工区	ﾋﾟｯﾄ内切付清掃		
基礎躯体工事 Ⅰ工区	ﾍﾞｰｽCON Ⅰ工区：290m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ1台	基準墨出				地中梁型枠	Ⅰ工区：基礎梁761m2 761m2=12m2/人・d x8人 x8d		地中梁型枠	Ⅰ工区：基礎梁761m2 761m2=12m2/人・d x8人 x8d		CON止め Ⅰ工区	打設足場架 地中梁CON Ⅰ工区：340m3 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	打設足場払	地中梁型枠解体 Ⅰ工区		歩廊足場解体 Ⅰ工区	ﾋﾟｯﾄ内切付清掃		小梁ｽﾗﾌﾞ型枠 Ⅰ工区：小梁85m2+ｽﾗﾌﾞ540m2 625m2=12m2/人・d x8人 x6d		小梁ｽﾗﾌﾞ型枠		断熱材張り	小梁・ｽﾗﾌﾞ配筋 Ⅰ工区：小梁等9.1t+ｽﾗﾌﾞ11.8t 20.9t=0.8t/人・d x8人 x4d		
検査・立会												型枠検査 Ⅰ工区地中梁 配筋検査 Ⅱ工区地中梁・耐圧盤						配筋検査 Ⅲ工区地中梁・耐圧盤				型枠検査 Ⅱ工区地中梁			型枠検査 Ⅲ工区地中梁				
施工図																															
施工計画書
