No. 05

新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

12月度　月間工程表

1/1

作成日:2019年10月 7日
修正日:2019年11月22日

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2019年12月 1日
竣工：2020年12月25日	2019年12月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体

監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月	12月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM
行事予定	全休	安全大会	定例会議					全休		定例会議					全休		定例会議		1月度 安全衛生協議会			全休		定例会議				全休	全休 全休～1/5	全休	全休

仮設工事 揚重機等

切梁・構台撤去
Ⅰ工区　X1-X10
※構台はY6～南撤去
東→西
12/12生ｺﾝ打設
搬出に制限有
鋼台の上資材置場
ｸﾛｰﾗｰは最西に配置！作業半径注意
切梁撤去
Ⅱ工区　X1-X10
※構台は残り全て
切梁撤去
Ⅱ工区　X1-X10
切梁撤去
Ⅲ工区　X10-X17

基礎躯体工事 B1F躯体工事 Ⅲ工区

打設足場払
歩廊足場解体
Ⅲ工区
小梁ｽﾗﾌﾞ型枠
Ⅲ工区：小梁90m2+ｽﾗﾌﾞ576m2
666m2=12m2/人・d x11人 x5d
ﾋﾟｯﾄ内切付清掃
地中梁型枠解体
Ⅲ工区
断熱材張り
小梁・ｽﾗﾌﾞ配筋
Ⅲ工区：小梁等9.8t+ｽﾗﾌﾞ12.6t
22.4t=0.8t/人・d x10人 x4d
差筋
打込配管
B1床CON
Ⅲ工区：150m3
800m2
鉄骨饅頭 仮ｱﾝｶｰ
柱壁配筋
Ⅲ-2工区(X15-16,Y7-10)：柱5本+壁5枚
先行配筋
基準墨出し
小墨出し
Ⅲ工区 鉄骨建方
建方
柱20P
梁6P
仮梁27P
まとめ
ｾﾊﾟｱﾝｸﾞﾙ取付

基礎躯体工事 B1F躯体工事 Ⅱ工区

ﾋﾟｯﾄ内切付清掃
小梁ｽﾗﾌﾞ型枠
Ⅱ工区：小梁107m2+ｽﾗﾌﾞ684m2
791m2=12m2/人・d x10人 x6d
断熱材張り
小梁・ｽﾗﾌﾞ配筋
Ⅱ工区：小梁等11.6t+ｽﾗﾌﾞ15.0t
22.6t=0.8t/人・d x12人 x3d
差筋
※ﾎﾟﾝﾌﾟ車北側X7付近に配置
CON止め　Ⅱ工区
B1床CON
Ⅱ工区：160m3
800m2
打込配管
基準墨出し
小墨出し
鉄骨饅頭
仮ｱﾝｶｰ
ｾﾊﾟｱﾝｸﾞﾙ取付
Ⅱ工区　(X1-10,Y5-10)
先行準備
建方
柱39P
梁26P
仮梁59P
鉄骨建方
建方
※X9,10-Y2,5もⅡ工区時に建てる
まとめ
※鉄筋材料先行搬入要
Ⅱ-1,2,3工区
鉄筋用足場架
Ⅱ-1,2,3工区
SRC梁配筋　17本
Ⅱ-3工区
柱筋圧接・配筋 柱8本
Ⅱ-3工区 柱壁型枠建込み 柱8本 壁7枚
Ⅱ-3工区 壁配筋 壁10枚
Ⅱ-2工区
柱筋圧接・配筋 柱11本
Ⅱ-2工区 柱壁型枠建込み 柱11本 壁11枚
Ⅱ-2工区 壁配筋 壁14枚
Ⅱ-1工区 柱壁型枠建込み 柱14本 壁7枚
Ⅱ-1工区 柱筋圧接・配筋 柱14本
Ⅱ-1工区 壁配筋 壁18枚
Ⅱ-1,2,3 壁22.9t=0.7t/人・d x8人 x4d

B1F躯体工事 Ⅰ工区

小梁・ｽﾗﾌﾞ配筋
Ⅰ工区：小梁等9.1t+ｽﾗﾌﾞ11.8t
20.9t=0.8t/人・d x8人 x4d
差筋
CON止め　Ⅰ工区
打込配管
B1床CON
Ⅰ工区：130m3
700m2
基準墨出し
小墨出し
鉄骨饅頭 仮ｱﾝｶｰ
ｾﾊﾟｱﾝｸﾞﾙ取付
※鉄筋材料先行搬入要
Ⅰ工区
鉄骨建方　(X1-8,Y1-5)
建方
柱21P
梁5P
仮梁19P
まとめ
※X9,10はⅡ工区時に建てる
Ⅰ-1工区 柱筋圧接・配筋
柱18本
Ⅰ工区：柱15.3t
Ⅰ-2工区 柱筋圧接・配筋
柱12本
Ⅰ-2工区 鉄筋用足場架
Ⅰ-2工区 SRC梁配筋 7本
Ⅰ-2工区 柱壁型枠建込み 柱12本 壁4枚
Ⅰ-2工区 壁配筋 壁11枚
Ⅰ-1工区 柱壁型枠建込み 柱18本 壁4枚
Ⅰ-1工区 壁型枠返し 壁4+11枚
Ⅰ-1,2 545m2=10m2/人・d x12人 x5d
Ⅰ-1工区 壁配筋 壁15枚
Ⅰ-1,2 壁18.1t=0.7t/人・d x8人 x4d

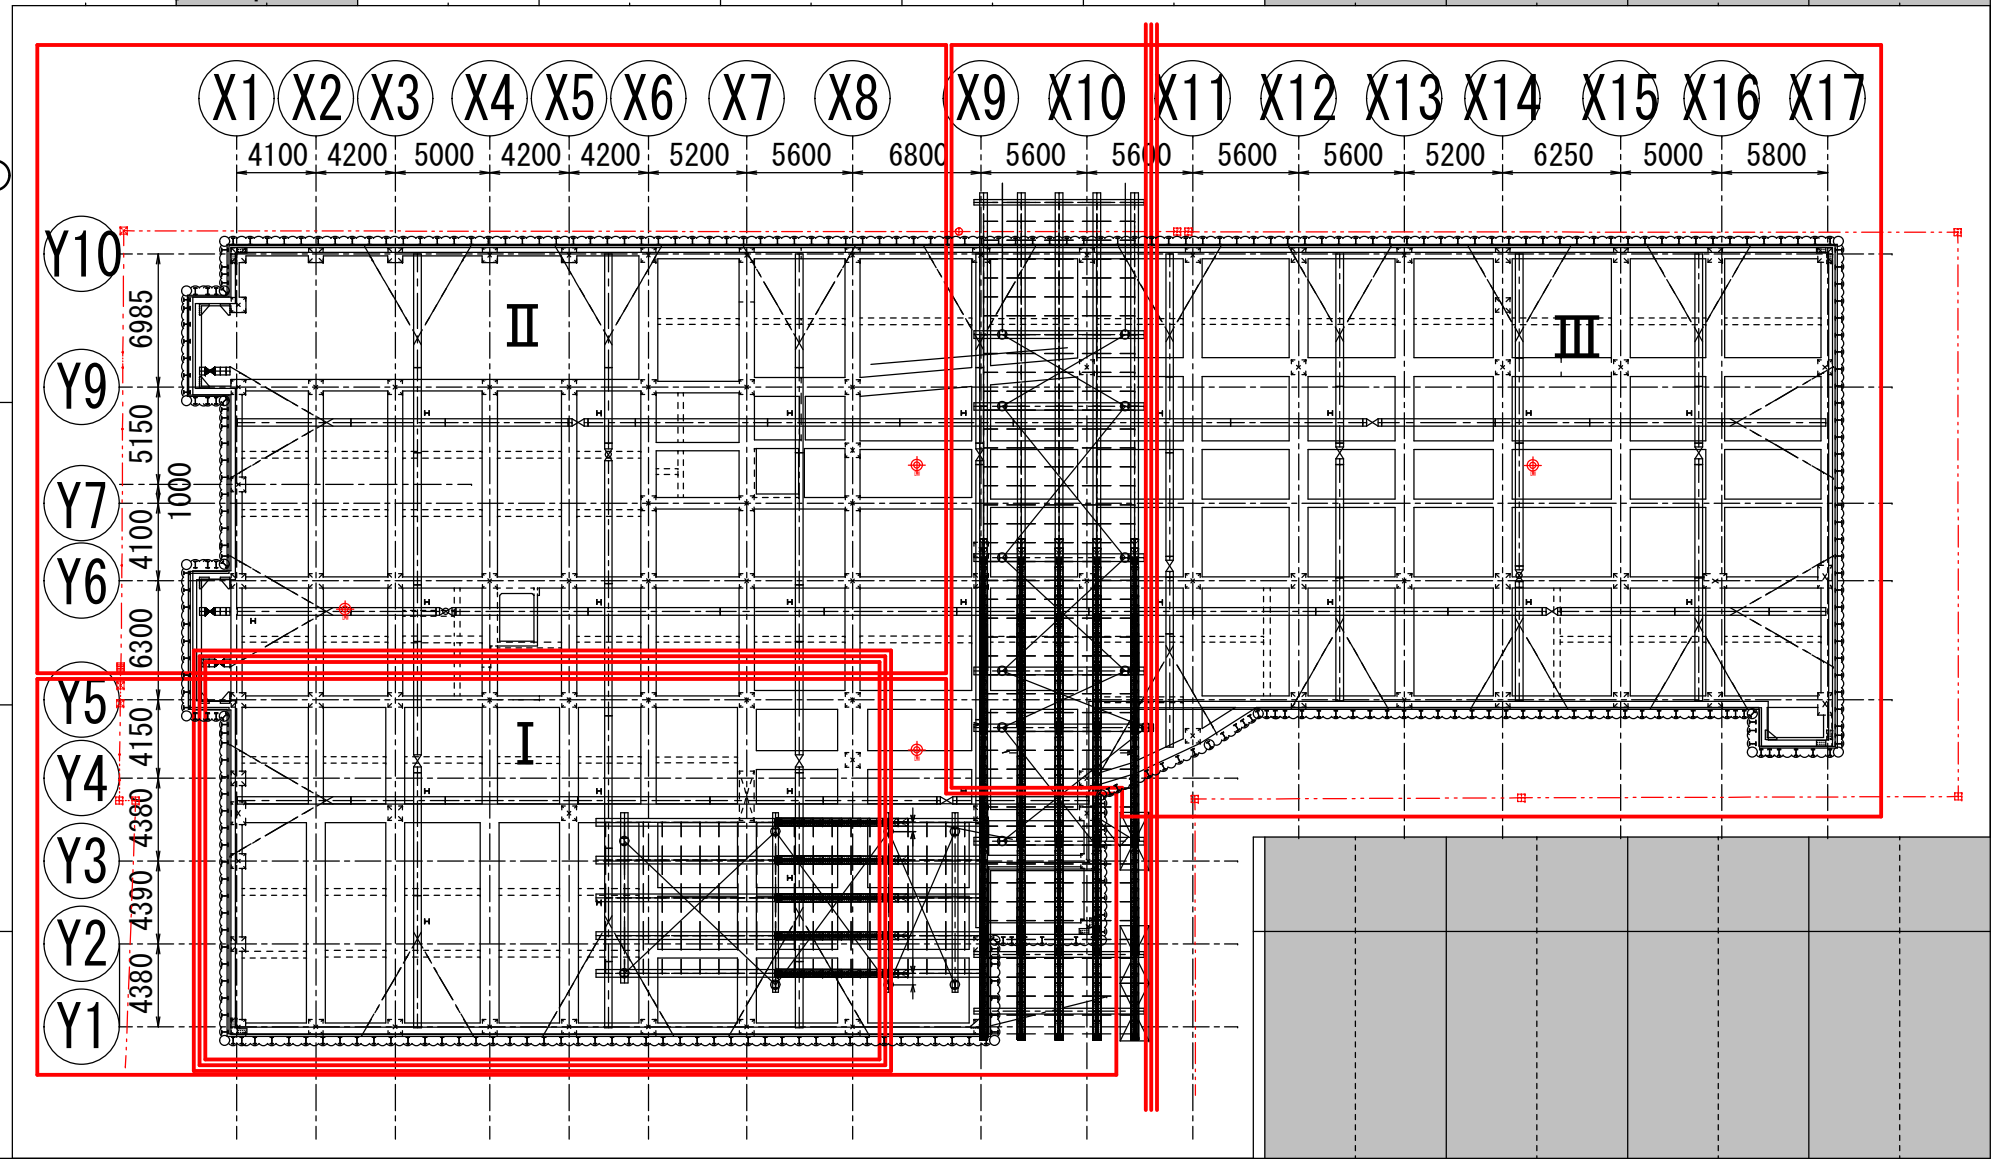

検査・立会

配筋検査
Ⅰ工区Ｂ１床
配筋検査
Ⅱ工区Ｂ１床
配筋検査
Ⅲ工区Ｂ１床
鉄骨製品検査
0節

施工図

3F総合図　市へ提出
4F総合図
監理へ提出
4F総合図
市へ提出

施工計画書

鉄骨製作要領書
鉄骨建方計画書
