新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

1月度　月間工程表

No. 06

作成日:2019年10月 7日
修正日:2019年10月15日

1/1

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2020年 1月 1日
竣工：2020年12月25日	2019年 1月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月	1月																																	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
行事予定	全休		全休		全休		全休		全休			全休							全休							全休									
B1F躯体工事 Ⅲ工区						鉄筋用足場架	SRC梁配筋 5本			鉄筋用足場払い																										
						Ⅲ-2,3工区				Ⅲ-3工区 柱壁型枠建込み			柱8本 壁1枚			Ⅲ-3工区 壁型枠返し		壁12+1枚																
							Ⅲ-3工区 柱筋圧接・配筋		Ⅲ-3工区 壁配筋				壁13枚																						
							柱8本																												
									Ⅲ-2工区 柱壁型枠建込み		柱12本 壁7枚																							
							Ⅲ-2工区 柱筋圧接・配筋		Ⅲ-2工区 壁配筋		壁13枚(内5枚先行配筋済)																							
							柱12本(内5本先行配筋済)																											
								Ⅲ-1工区	柱壁型枠建込み		柱10本 壁5枚																						
						Ⅲ-1工区 柱筋圧接・配筋		Ⅲ-1工区	壁配筋	壁9枚																							
						柱10本		Ⅲ-1,2,3 19.3t=0.7t/人・d x8人 x4d																									
B1F躯体工事 Ⅱ工区							SRC梁配筋 17本			Ⅱ-1,2,3工区 鉄筋用足場払い																								
							Ⅱ-3工区 柱壁型枠建込み		柱8本 壁7枚				Ⅱ-3工区 壁型枠返し 壁3+7枚			Ⅱ-3工区 大梁小梁掛け G梁20本,B梁9本																	
							Ⅱ-3工区 壁配筋		壁10枚							300m2=9m2/人・d x5人 x6d																	
								Ⅱ-2工区 柱壁型枠建込み	柱11本 壁11枚	Ⅱ-2工区 壁型枠返し 壁3+11枚					Ⅱ-2工区 大梁小梁掛け G梁21本,B梁13本																			
								Ⅱ-2工区 壁配筋	壁14枚						360m2=9m2/人・d x7人 x6d																	
														Ⅱ-1工区 柱壁型枠建込み	Ⅱ-1工区 壁型枠返し 壁11+7枚																		
														Ⅱ-1工区 壁配筋	Ⅱ-1,2,3 660m2=10m2/人・d x12人 x5d																
														壁18枚																	
B1F躯体工事 Ⅰ工区																																		
						鉄筋用足場払い																											
						柱壁型枠建込み	Ⅰ-2工区 壁型枠返し 壁4+8枚																										
						Ⅰ-1工区	壁型枠返し 壁4+11枚			Ⅰ-1工区 大梁小梁掛け																							
						Ⅰ-1,2 545m2=10m2/人・d x12人 x5d																											
検査・立会																																		
施工図																																		
施工計画書																																		

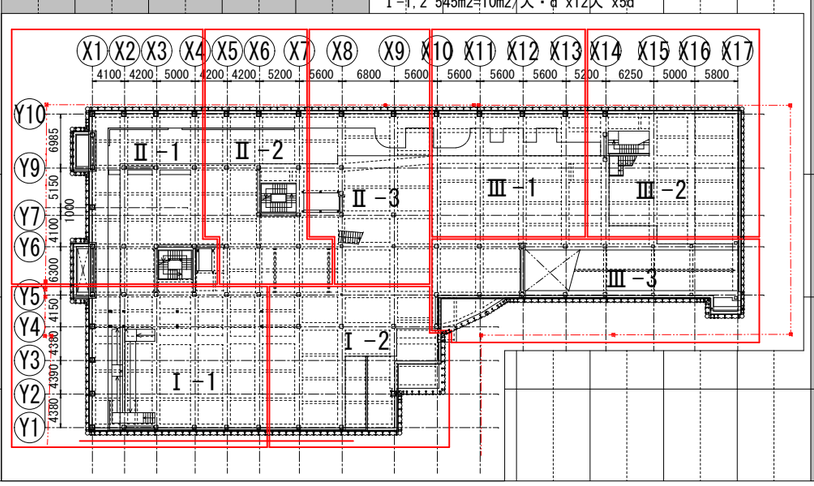

G梁29本,B梁20本
470m2=9m2/人・d x8人 x6d
Ⅰ-1工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
340m2=15m2/人・d x8人 x3d
断熱材貼り
340m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
Ⅰ-1工区 大梁小梁配筋 G梁29本,B梁20本 20.6t=0.7t/人・d x8人 x4d
溶接 溶接
型枠固め
Ⅰ-1工区 ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋等
7.3t=0.5t/人・d x8人 x2d
ｽﾗﾌﾞ配管・ｲﾝｻｰﾄ
Ⅰ-1工区 CON止め
Ⅰ-2工区 ｽﾗﾌﾞ配筋
5.3t=0.5t/人・d x8人 x2d
Ⅰ-2工区 CON止め
Ⅰ-2工区 大梁小梁配筋 G梁21内SRC7本,B梁15本 15.1t=0.7t/人・d x8人 x3d
溶接 溶接
型枠固め
Ⅰ-2工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
350m2=9m2/人・d x7人 x5d
240m2=15m2/人・d x7人 x3d
断熱材貼り
240m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
Ⅰ-2工区 大梁小梁掛け G梁21本,B梁15本
Ⅱ-1工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
260m2=15m2/人・d x6人 x3d
断熱材貼り
260m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
Ⅱ-1工区 大梁小梁配筋 G梁23内SRC7本,B梁12本 16.3t=0.7t/人・d x8人 x3d
溶接 溶接
型枠固め
Ⅱ-1工区 ｽﾗﾌﾞ配筋 5.7t=0.7t/人・d x6人 x2d
Ⅱ-1工区 大梁小梁掛け G梁23本,B梁12本
380m2=9m2/人・d x7人 x5d
Ⅱ-2工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
250m2=15m2/人・d x6人 x3d
断熱材貼り
250m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
Ⅱ-2工区 大梁小梁配筋 G梁21内SRC2本,B梁13本 15.8t=0.7t/人・d x8人 x3d
溶接 溶接
型枠固め
Ⅱ-2工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
220m2=15m2/人・d x6人 x3d
Ⅱ-3工区 大梁小梁配筋 G梁20内SRC8本,B梁9本 13.1t=0.7t/人・d x8人 x3d
溶接
断熱材貼り
220m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
型枠固め
Ⅱ-3工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
220m2=15m2/人・d x6人 x3d
Ⅱ-3工区 大梁小梁掛け G梁20本,B梁9本
300m2=9m2/人・d x5人 x6d
Ⅲ-3工区 ｽﾛｰﾌﾟ部分ｽﾗﾌﾞ型枠貼り
Ⅲ-3工区 壁型枠返し 壁12+1枚
ｽﾛｰﾌﾟ部分 足場架け
ｽﾛｰﾌﾟ部分 壁型枠返し
Ⅲ-3工区 大梁小梁掛け G梁12本,B梁10本
220m2=9m2/人・d x8人 x3d
ｽﾛｰﾌﾟ部分ｽﾗﾌﾞ配筋
Ⅲ-2工区 大梁小梁配筋
Ⅲ-2工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
断熱材貼り
型枠固め
Ⅲ-2工区 大梁小梁掛け G梁15本,B梁13本
280m2=9m2/人・d x5人 x6d
200m2=15m2/人・d x5人 x2d
200m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
Ⅲ-1工区 大梁小梁配筋
Ⅲ-1工区 ｽﾗﾌﾞ掛け(ﾃﾞｯｷ)
断熱材貼り
型枠固め
Ⅲ-1工区 大梁小梁掛け G梁22本,B梁16本
370m2=9m2/人・d x7人 x6d
260m2=15m2/人・d x6人 x3d
260m2 ﾃﾞｯｷ墨出し
Ⅲ-1,2,3 550m2=10m2/人・d x12人 x5d
Ⅲ-1工区 壁型枠返し 壁4+5枚
配筋検査
Ⅰ工区
