新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

3月度　月間工程表

1/1

No. 08

作成日：2020年 1月24日
修正日：2020年 2月10日

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2020年 3月 1日
竣工：2020年12月25日	2020年 3月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体

監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月：3月

日：1日 全休 / 2日 安全大会 / 3日 定例会議 / 4日 / 5日 / 6日 / 7日 / 8日 全休 / 9日 / 10日 定例会議 / 11日 安全パトロール / 12日 / 13日 / 14日 / 15日 全休 / 16日 / 17日 定例会議 / 18日 / 19日 安全衛生協議会 / 20日 / 21日 / 22日 全休 / 23日 / 24日 定例会議 / 25日 / 26日 職長会 / 27日 / 28日 / 29日 全休 / 30日 / 31日 総合定例会議

行事予定

- 安全大会
- 定例会議
- 定例会議
- 安全パトロール
- 定例会議
- 安全衛生協議会
- 定例会議
- 職長会
- 総合定例会議

仮設工事

- 階段4受け支保工足場組立 1～3F
- 外部足場組立 A工区 西面
- 外部足場組立 A工区 南面
- 外部足場組立 A工区 南面
- 外部足場組立 B工区 西面
- 階段4受け支保工足場組立 3～4F
- 外部足場組立 B工区 北面

鉄骨工事

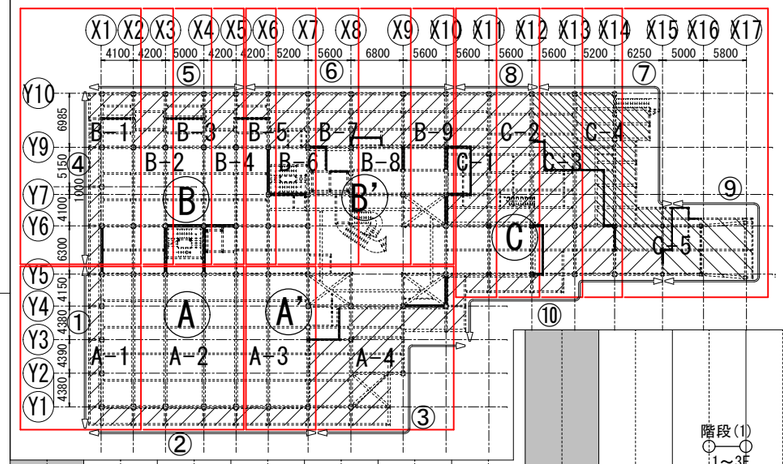

B工区 2節

- 階段(1) 3～RF
- B-3工区(2B20) 鉄骨建方 柱4p 間2p G17p+B15p V3
- B-4工区(2B21) 鉄骨建方 柱4p 間12p G15p+B30p V2
- 建て起し本締め
- B-1工区(2B18) 鉄骨建方 柱7p G24p+B18p V2
- B-2工区(2B19) 鉄骨建方 柱5p G15p+B13p V1
- 建て起し本締め
- 階段(2) 3～4F
- B-7工区(2B24) 鉄骨建方 柱13p間12p G23p+B45p
- 建て起し本締め
- B-8,9工区(2B25) 鉄骨建方 柱23p G41p+B47p V2
- 階段(4) 3～4F
- B-5工区(2B22) 鉄骨建方 柱4p G13p+B10p V2
- B-6工区(2B23) 鉄骨建方 柱2p間6p G9p+B17p V2
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-5,6工区4,RF
- ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｽ搬入 2節 B-5～9工区
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-7,8,9工区4,RF

B工区 1節

- 階段(4) 1～3F
- 調整
- B-9工区(1B17) 鉄骨建方 柱4p 間4p G16p+B18p
- 建て起し本締め
- 階段(2) 1～3F
- B-7工区(1B15) 鉄骨建方 柱5p 間15p G13p+B37p V2
- B-8工区(1B16) 鉄骨建方 柱4p G8p+B22p
- 建て起し本締め
- 階段(1) 1～3F
- B-5工区(1B13) 鉄骨建方 柱5p 間2p G13p+B9p V2
- B-6工区(1B14) 鉄骨建方 柱4p 間10p G11p+B27p V2
- 建て起し本締め
- ｽﾀｯﾄﾞ 溶接 2F B-1～4工区
- ｽﾀｯﾄﾞ 溶接 3F B-1～4工区
- ｽﾀｯﾄﾞ 溶接 4F B-1～4工区
- ｽﾀｯﾄﾞ 溶接 RF B-1～4工区
- B-3工区(1B11) 鉄骨建方 柱4p 間3p G12p+B16p V4
- B-4工区(1B12) 鉄骨建方 柱4p 間10p G11p+B27p V2
- 建て起し本締め
- 柱溶接 1F B-1～4工区(1B9～1B12) 柱17p 5dx4p/d
- 1F腰壁型枠建込み B工区 40m2=8m2/人x5人x3d
- B-1工区(1B9) 鉄骨建方 柱9p 間5p G22p+B38p V5
- B-2工区(1B10) 鉄骨建方 柱4p 間2p G11p+B13p V4
- 建て起し本締め
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-1,2工区2,3F
- ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｽ搬入 1節 B-1,2,3,4工区
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-3,4工区2,3F
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-1,2工区4,RF
- ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｽ搬入 2節 B-1～4工区
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-3,4工区4,RF
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-5,6,7工区2,3F
- ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｽ搬入 1節 B-5～7工区
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-1,2,3,4工区2F
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-1,2,3,4工区3F
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-1,2,3,4工区4F
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-1,2,3,4工区RF
- ﾃﾞｯｷ搬入 B-8,9工区2,3F
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 3F B工区(B1～4)
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 2F B工区(B1～4)

A工区 2節

- 2節 A-3工区(2A7) A-4工区(2A8) 鉄骨建方 柱7p 間5p G16p+B40p 柱4p 間7p G15p+B24p V4
- 建て起し本締め
- A-4工区 鉄骨建方 柱8p間16p G24p+B77p V1
- 建て起し本締め
- ﾃﾞｯｷ搬入 A-3,4工区4,RF
- ﾃﾞｯｷ敷込 A-1,2工区3,4F
- ﾃﾞｯｷ敷込 A-3,4工区3,4F
- ﾃﾞｯｷ敷込 A-1,2,3,4工区RF
- 柱溶接 1F A-1,2,3,4工区(1A1,1A2,1A3,1A4) 柱24p 6dx4p/d
- 1F腰壁型枠建込み A,A'工区 150m2=8m2/人x5人x4d
- ｽﾀｯﾄﾞ 溶接 3F A-1,2,3,4工区
- 3Fｽﾗﾌﾞ 配筋 A,A'工区 3FL-670ｽﾗﾌﾞ
- 3Fｽﾗﾌﾞ 配筋
- 3F下り壁型枠建込 ①→②→③
- 3F下り壁配筋 ①→②→③
- 1F腰壁配筋 A,A'工区
- 1F腰壁型枠返し固め A,A'工区 4/2con
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 3F A,A'工区
- ｽﾀｯﾄﾞ 溶接 4F A-1,2,3,4工区

検査・立会

- 鉄骨階段2製品検査

施工図

施工計画書
