No. 10

# 新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

## 5月度　月間工程表

1/1

作成日:2020年 4月10日
修正日:2020年　月　日

| 工期（契約工期） | 当該工事工期 |
|---|---|
| 着工：2019年 7月 5日 | 2020年 5月 1日 |
| 竣工：2020年12月25日 | 2020年 5月31日 |

| 鴻池・三喜特定建設工事共同企業体 | | | |
|---|---|---|---|
| 監理者 | 現場代理人 | 担当者 | 作成者 |
| | 森 | | 森 |
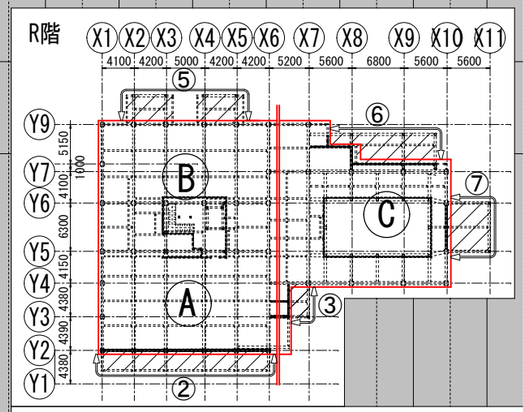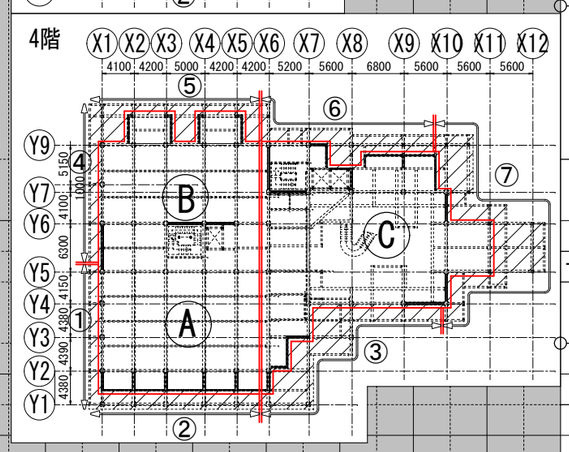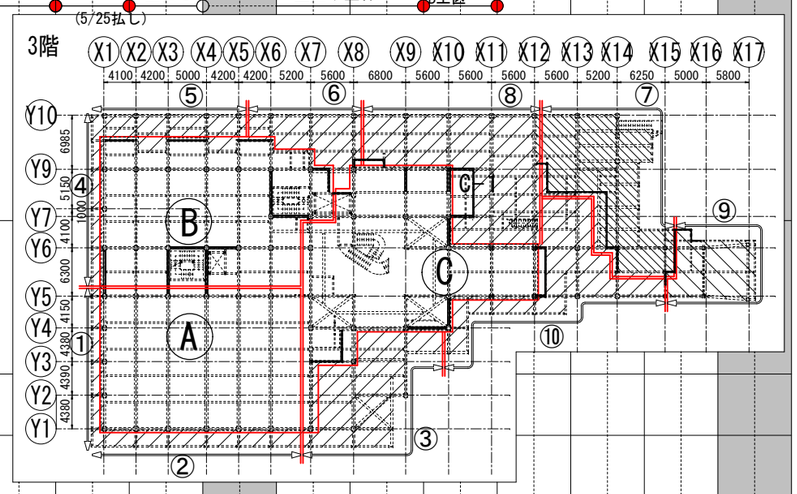
| 月 | 5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | | | |
| | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | AM PM | | | | |
| 行事予定 | 安全大会（中止） | 全休 | 全休 | 全休 | 全休 | 全休 | 全休 | 全休 | 全休 | 全休 | | 定例会議 | | | | | 全休 | | 定例会議 | | | 安全衛生協議会 | | 全休 | | 定例会議 総合 | | | | | 全休 | | | | |
| 仮設工事 | | | | | | | | | | | | | | | 内部足場組立 カフェ X2-X7 | | | 外部足場組立 3F C工区⑧,⑩ 5/19⑩ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ枠払し有 5/20C工区CON有 | | | | | | | 内部足場組立 外部足場組立 4F A工区①② | | | | | | クローラークレーン解体 仮設ﾔｰﾄﾞ全面使用（他搬入出不可） 外部足場組立 4F B工区④⑤ | | | | |
| 外壁工事 | | | | | | | | | | | | | 着手 ｱﾝｸﾞﾙ搬入 | 外壁ECP貼り ECP搬入 (1F+2F) | | A→B→C工区 | | 外壁ECP貼り | 1,2F 920m2 20dx30m2/dx1.5班 ECP搬入 (2F) | | A→B→C工区 | | | | 外壁ECP貼り | 1,2F 920m2 16dx30m2/dx1.5班 | | | 外壁ECPｼｰﾙ | A→B→C工区 A→B→C工区 | | 1F,2F：～6/4 | | | | |
| 躯体工事 R階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠建込 ② | | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋 ② 下がり壁型枠建込 X1側 | | | | | | |
| 4階 | | | | | | | | | | | 4F下り壁型枠建込 ④→⑤ | | | 4F下り壁型枠建込 ③ 下がり壁配筋 ④→⑤ | | | | 手すり金物取付 4F下り壁型枠建込 ⑥ 下がり壁配筋 ③ 下がり壁型枠返し固め ④→⑤ | | | 4F下り壁型枠建込 ⑦ 下がり壁配筋 ⑥ 下がり壁型枠返し固め ③ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ④,⑤ FL-670 墨出し (5/25払し) | | | | 下がり壁配筋 ⑦ 下がり壁型枠返し固め ⑥ 下がり壁型枠返し固め ③ 立上り型枠 | | | 下がり壁型枠返し固め ⑦ 下がり壁型枠返し固め ⑥ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ③ FL-670 (6/1払し) 墨出し | | 6/3ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ⑦ FL-670 6/1 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ⑥ FL-670 立上り型枠 6/9 ｽﾗﾌﾞCON C工区 FL±0 | | | |
| 3階 | ｽﾗﾌﾞ配筋 C工区 FL-1,130 FL±0 下がり壁型枠返し固め ⑨→⑩ 墨出し ⑦ FL-1,440 | | | | | | | | | | 下がり壁型枠返し固め ①→② | | | | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ①,② FL-670 (5/18払し) 墨出し | | | ｽﾗﾌﾞ配筋 C工区 FL±0 FL-1,130 下がり壁型枠返し固め ⑨→⑩ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ⑨ FL-1,130 墨出し 止型枠 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ⑩ FL-670 (5/19払し) 立上り型枠 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON ⑧ FL-670 (5/18払し) | | | 打込配管 墨出し 立上り型枠 ｽﾗﾌﾞCON C工区 FL+670 FL±0 | | | 5/27 ｽﾗﾌﾞCON A工区 B工区 FL±0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階 | 手すり金物取付 2F（=CON止） | | | | | | | | | | | | | | | | | 手すり金物取付 2F（=CON止） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | 腰壁型枠建込、配筋 C工区 | | | | | | | | | | | | | | | | | 腰壁配筋、型枠返し固め C工区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※仮設休憩所ｴﾘｱ先行施工 閉架書庫(1) 天井内配線配管等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 階段2：段ﾓﾙﾀﾙ B1F～1F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査・立会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工図 施工計画書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
