新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

6月度　月間工程表

1/1

No. 11

作成日：2020年 4月10日
修正日：2020年 5月26日

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2020年 6月 1日
竣工：2020年12月25日	2020年 6月30日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月：6月

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
AM	○	○	○	○	○	全休	全休	○	○	○	○	○	○	全休	○	○	○	○	○	○	全休	○	○	○	○	○	全休	全休	○	○	○
PM	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○	○	○

行事予定

- 安全大会
- 定例会議
- 外部足場組立
- 4F C工区③→⑦→⑥
- 全休
- 定例会議
- 社内検査
- 安全衛生協議会
- 全休
- 全休
- 定例会議
- 総合
- 安全大会

仮設工事

- 内部足場組立　児童図書
- 外部足場組立　PH足場
- 外部足場組立　ﾊｲｻｲﾄ足場

外壁工事

- 1,2F 920m2 16dx30m2/dx1.5班　C工区
- 外壁ECP貼り　3F 930m2 15dx30m2/dx 2班
- ECP下地調整 3F
- ECP搬入（3FA,B工区）
- 外壁ECP貼り 3F 930m2 15dx30m2/dx 2班
- 1,2F 外壁ECP盤間ｼｰﾙ
- ECP搬入（3FC工区）
- ECP下地調整 4F
- 外壁ECP貼り 3F 930m2 15dx30m2/dx 2班
- 1FAW搬入
- AW取付け 1F
- 外壁ECP貼り 3F 930m2 15dx30m2/dx 2班
- ECP搬入（4F）
- 6月下旬（納期未確定）
- 外壁ECP貼り
- 4F 530m2 9dx30m2/dx 2班
- 外装ﾀｲﾙ張り
- 外装ﾀｲﾙ張り
- AW取合いｼｰﾙ

躯体工事 PH階

- ﾊｲｻｲﾄ墨出し
- ﾊｲｻｲﾄ 壁型枠建込み
- ﾊｲｻｲﾄ 壁配筋
- ﾊｲｻｲﾄ 壁型枠返し固め
- 墨出し
- 壁型枠建込み　PH
- 壁配筋　PH
- 壁型枠返し固め　PH
- ｽﾗﾌﾞ 等配筋
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ返し固め
- PHCON
- ﾊｲｻｲﾄ 壁型枠返し固め
- ﾊｲｻｲﾄ 7/3CON

R階

- 下がり壁型枠建込　Y4, X10, Y9側
- 下がり壁配筋　Y4, X10, Y9側
- 下がり壁型枠返し固め　Y4, X10, Y9側
- ｽﾗﾌﾞﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON　C工区（6/29 7d）
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠建込　⑥
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋　⑥
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め　⑥
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON　③⑦⑥（6/23 7d）
- 立上り型枠
- 墨出し
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋　Y4, X10, Y9側
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠建込　⑦
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋　⑦
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め　⑦
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠建込　③
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋　③
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め　③
- 下がり壁型枠返し固め　X1側
- ｽﾗﾌﾞﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON　A工区 B工区（6/22 7d）
- X1側 下がり壁型枠建込
- X1側 下がり壁配筋
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋 ②
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠建込 ⑤
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋 ⑤
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め ⑤
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON 立上り型枠 ②⑤
- 墨出し　Y1, Y9側
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋　Y1, Y9側
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め　Y1, Y9側

4階

- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄCON 墨出し
- ⑦FL-670（6/6払し）
- 立上り型枠
- ｽﾗﾌﾞ CON　C工区 FL±0
- 立上り型枠
- 墨出し
- 立上り型枠

躯体，仕上工事 1，2階

- X1-Y9, 9a間 敷桟
- 壁型枠建込み
- 壁配筋
- 化粧柱ﾒｯｼｭ巻き
- 化粧柱　柱型枠
- X11, 13-Y10　先行2本
- X1-Y5, 6間 壁型枠建込み
- ｽﾗﾌﾞ張り
- ｽﾗﾌﾞ配筋
- 壁配筋
- 壁型枠返し固め
- X1-Y9, 9a間 壁配筋
- 2本
- 化粧柱CON X11, 13-Y10
- 壁型枠返し固め
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ配筋 X1-Y5, 6間
- ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ型枠返し固め
- X1-Y9, 9a間 CON
- 養生
- 脱型
- X1-Y5, 6間 CON
- 3F 耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け
- 敷桟
- ECP上部ｹｲｶﾙ塞ぎ
- ECP上部ｹｲｶﾙ塞ぎ　耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け
- ECP上部ｹｲｶﾙ塞ぎ
- 耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け
- ECP上部ｹｲｶﾙ塞ぎ
- 耐火間仕切先行ﾋﾟｰｽ付け
- 耐火遮音間仕切り
- 断熱吹付
- 耐火被覆吹付　4,000㎡ 180m2/班x20d
- 耐火被覆吹付　4,000㎡ 180m2/班x20d
- 耐火被覆吹付　4,000㎡ 180m2/班x20d
- 耐火被覆吹付　4,000㎡ 180m2/班x20d

仕上工事 B1階

- 空調機械室(1) 天井壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張り　約200m2 3d　※足場関係上部のみ、西面ﾀﾞﾒ（未確定）
- 空調機械室(1)，受水槽室，電気室 天井足場解体
- 湧水ﾌｫｰﾑ敷込み
- 空調機械室(1)，受水槽室 ﾜｲﾔﾒｯｼｭ敷込み
- 空調機械室(1)，受水槽室 嵩上げCON
- SD枠取付けB1F　B1FSD搬入

階段

- 屋外階段(1) 型枠建込み
- 階段2
- 階段ﾓﾙﾀﾙ
- 養生　1F～4F
- 屋外階段(1) 壁・段配筋
- 屋外階段(1) 型枠返し固め
- 屋外階段(1) 階段CON

検査・立会

施工図 施工計画書
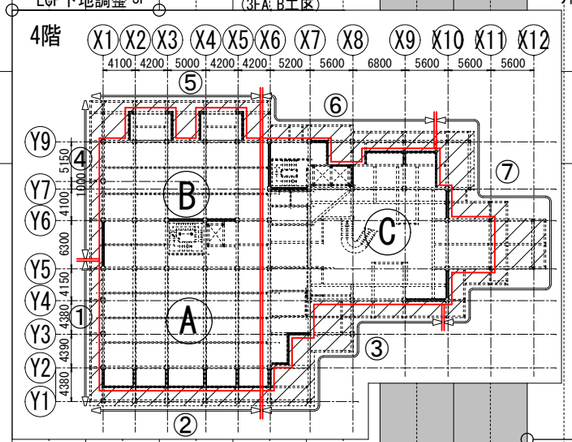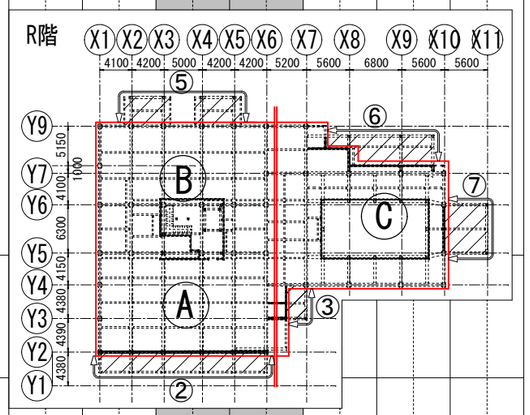
- 耐火被覆吹付　施工計画書
- LGS,ﾎﾞｰﾄﾞ ｱﾙﾐ製建具　施工計画書
- 鋼製建具　施工計画書
