新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

8月度　月間工程表

No. 13

作成日：2020年 7月17日
修正日：2020年　月　日

1/1

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2020年 8月 1日
竣工：2020年12月25日	2020年 8月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森
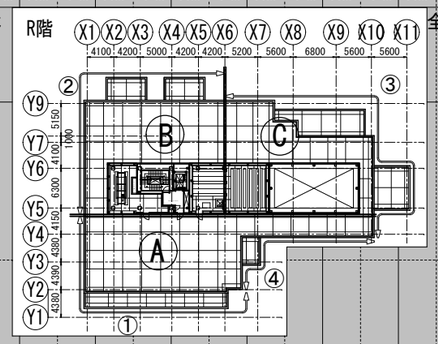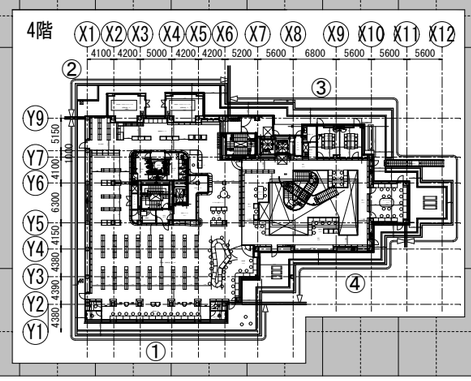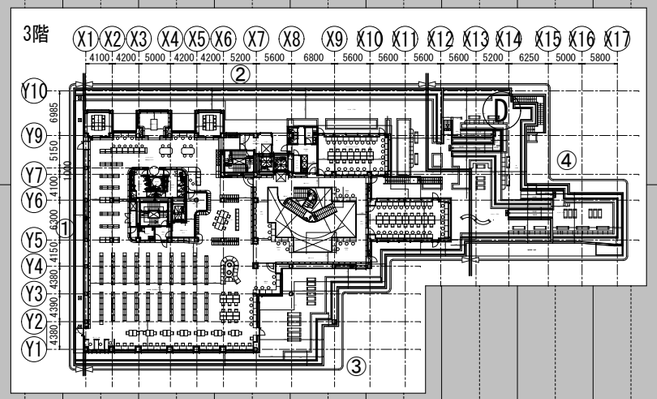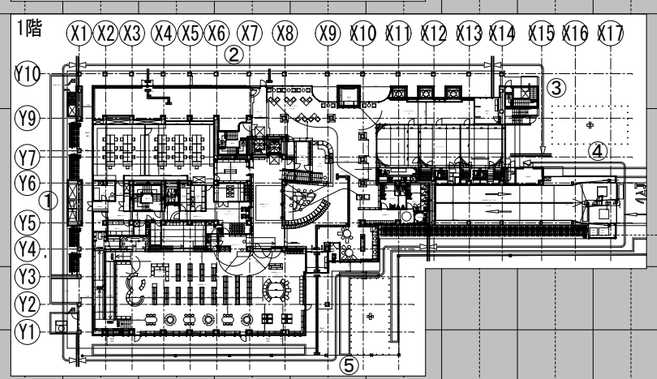
月	8月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	
行事予定		全休	外壁市長ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 安全大会						全休	全休					全休	全休		定例会議					全休					安全衛生協議会		全休		
外部 R階						水張り試験 RF, PHRF, ﾊｲｻｲﾄ											防水工事 断熱材張り	RF 保護ｺﾝ目地張り Ⓐ Y1→Y5 （庇含む）	RF ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 機械台他	460m2		RF ﾜｲﾔﾒｯｼｭ敷 Ⓐ Y1→Y5 460m2	RF 保護ｺﾝ目地張り Ⓑ Y9a→Y5 X1→X6 （庇含む）	400m2	RF Ⓐ 保護CON打設 Y1→Y5 460m2	RF 笠木取付 ①④ Y1→Y5	ﾜｲﾔﾒｯｼｭ敷 Ⓑ Y9a→Y5 X1→X6 400m2	RF 笠木取付 ② Y9a→Y5 X1→X6	RF 笠木ｼｰﾙ Y1→Y5	RF Ⓑ 保護CON打設 Y9a→Y5 400m2	笠木ｼｰﾙ Y9a→Y5 X1→X6	
	Ⓑ Ⓒ RF 防水工事（断熱保護） Y9a→Y5 （庇含む） 740m2=30m2x4人x6d																					RF 保護ｺﾝ目地張り Ⓒ Y9a→Y5 X6→X11 （庇含む） 340m2										
	RC壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 ① RF西面→南面 100m2=50m2x2d			RC壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 ② RF西面→北面 100m2=50m2x2d													RC壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 ③ RF北面→東面 125m2=50m2x3d		RC壁ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱ塗装 ④ RF東面→南面 65m2=50m2x2d		4Fは9/1～											
4階																			外装ECP塗装 4F①南面、西面		4F AW取合いｼｰﾙ			外装ECP塗装 4F②西面、北面				外装ECP塗装 4F③北面東面			
																		AW取合いｼｰﾙ 4F AW取り付け ①南面 ①南面→②北面→③北面→④東面						外装ﾀｲﾙ張り 4Fﾀﾞﾒ								
																	4FAW搬入							防水工事（断熱保護） 4F①南面、西面 外周立上り先行			防水工事（断熱保護） 4F②西面、北面 外周立上り先行			防水工事 （断熱保護） 4F④南面 外周立上り先行		
3階						3F 樋工事 外部4G梁 ①西面→②北面→③南面											樋工事 外部4G梁 ①西面→②北面→③南面							3F ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ軒天下地 ①西面			3F ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ軒天下地 ③南面			3F ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ軒天下地 ②北面		
	耐火被覆吹付 3F外部4G梁 ①西面→②北面→③南面																		外装ECP塗装 3F①西面					外装ECP塗装 3F②北面				外装ECP塗装 3F②東面			
																					3F Ⓓ 防水工事（断熱保護） X12→X17 280m2=30m2x4人x3d 180m2=30m2x4人x2d			3F 防水工事（断熱保護） X12→X17 280m2=30m2x4人x3d 180m2=30m2x4人x2d		水張り試験 3F X12→X17 Ⓓ		保護ｺﾝ目地張り Ⓓ 3F X12→X17 460m2		
1，2階																																
																						樋工事 外部3G梁 南面→西面→北面			樋工事 外部3G梁 南面→西面→北面					樋工事 外部3G梁 化粧柱付近梁		
																	耐火被覆吹付 1F外部3G梁 南面→西面→北面 ※化粧柱 未CON周りは残し											耐火被覆吹付 1F外部3G梁 化粧柱付近梁 X1-Y8 X1, 2, 3-Y10				
化粧柱	養生	脱型 化粧柱CON X1通り 4本 Y1, 2, 3, 4	養生	脱型													化粧柱 柱型枠 4本 X1-Y8 X1, 2, 3-Y10							化粧柱CON 4本 X1-Y8 X1, 2, 3-Y10	養生	脱型							
階段		屋外階段支保工解体															屋外階段(1) 階段ｱｽﾌｧﾙﾄ防水							屋外階段(1) 階段筋組、型枠						屋外階段CON 段CON		
ELV			ELV工事 ELV2, 3号機																3F～4F 鉄骨階段取付け ELV工事 ELV2, 3号機						ELV工事 ELV2, 3号機			ELV足場解体 ELVﾋﾟｯﾄ防水 ELV1号機 ELV1号機					
検査・立会			外壁市長ﾌﾟﾚｾﾞﾝ																													
施工図 施工計画書
