新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

8月度　月間工程表

No. 13

作成日:2020年 7月17日
修正日:2020年　月　日

1/1

工期（契約工期）	当該工事工期
着工：2019年 7月 5日	2020年 8月 1日
竣工：2020年12月25日	2020年 8月31日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月	8月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM	AM PM
内部 R階		全休						全休	全休							全休							全休							全休	
4階	STD取付け 9本		STD取付け 9本																												
3階	壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り		北エリア→南エリア→階段4吹抜廻り→東ｴﾘｱ	壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り			3F 断熱吹付										3F 断熱吹付			天井内塗装 （黒） 北エリア→南エリア→階段4吹抜廻り						途中でもﾊｲｻｲﾄへ							
2階																															
1階																															
B1階			塗床 空調機械室，受水槽，電気室 泡消火，排煙機械室1，2																												

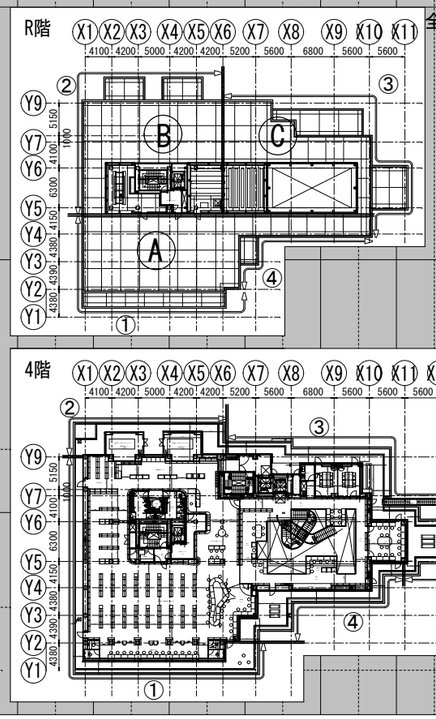

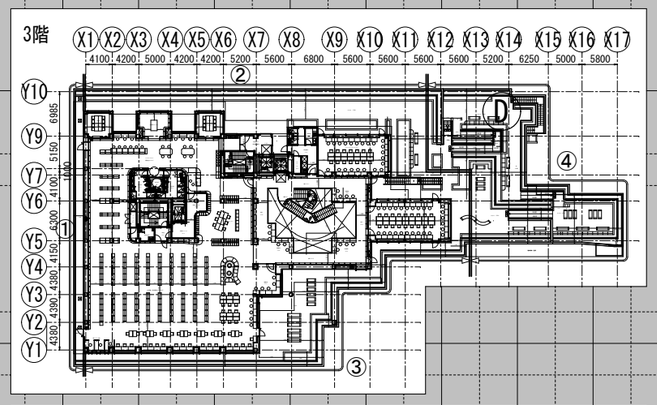

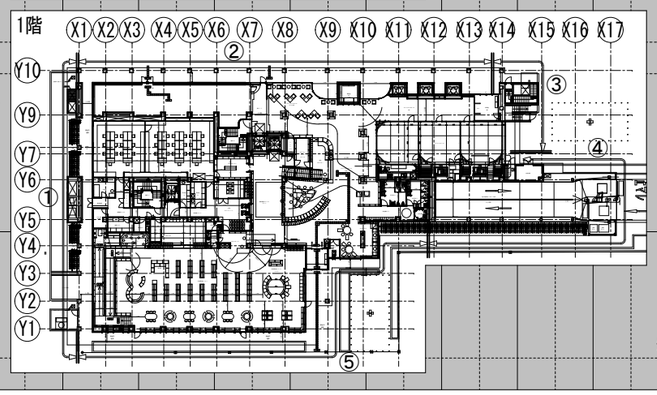

内部 R階
- 耐火遮音間仕切り ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ
- ELV1,PS
- SD取付け
- RFSD搬入
- 取付順3F→4F→RF
- ﾄﾛ詰め ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ
- 耐火被覆吹付 PHR梁
- 断熱吹付 ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ
- 壁天井LGS ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ
- 柱耐火工事 ﾊｲｻｲﾄ
- AW取り付け
- AW68,69,70搬入 ﾊｲｻｲﾄ
- ※4階取付け後
- ﾄﾛ詰め ﾊｲｻｲﾄ
- 断熱吹付 ﾊｲｻｲﾄ
- 天井内塗装 +梁錆止め塗装 （壁・天井） ﾊｲｻｲﾄ
- 天井・壁LGS ﾊｲｻｲﾄ

4階
- STD取付け 9本
- STD取付け 9本
- 耐火遮音間仕切り ﾎﾞｰﾄﾞ
- ※階段4吹抜廻り先行
- 耐火遮音間仕切り
- 壁ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- ※階段4吹抜廻り先行
- 耐火遮音間仕切り LGS
- 壁LGS
- 天井内塗装 （黒） 階段4吹抜廻り
- 壁LGS
- AW取り付け
- ①南面→②北面→③北面→④東面
- 取合いｼｰﾙ
- SD取付け 4FSD搬入
- 取付順3F→4F→RF
- 4FAW搬入
- 4F 断熱吹付
- 耐火被覆吹付
- 3,300㎡ 180m2/班x18d
- 4F 断熱吹付

3階
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 北エリア→南エリア→階段4吹抜廻り→東ｴﾘｱ
- 3F 断熱吹付
- 天井内塗装 （黒） 北エリア→南エリア→階段4吹抜廻り
- 途中でもﾊｲｻｲﾄへ
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 北エリア→南エリア→階段4吹抜廻り→東ｴﾘｱ
- 3F 断熱吹付
- SD取付け 取付順1F→3F 3FSD搬入
- SD取付け 取付順3F→4F→RF
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 北エリア→南エリア→階段4吹抜廻り→東ｴﾘｱ
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- STD取付け 9本
- AW取付け AW27,40,43,47,49搬入
- 取合いｼｰﾙ

2階
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- SD取付け 2FSD搬入
- AW取付け AW11,12,21搬入
- 取付順3F→2F→1F
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- SD取付け 取付順2F→1F
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 足場組立 ｽﾛｰﾌﾟ上
- 耐火被覆吹付 ｽﾛｰﾌﾟ上
- 天井内塗装 ｽﾛｰﾌﾟ上 （黒）
- 天井内塗装 （黒） 階段4吹抜廻り→ｴﾝﾄﾗﾝｽ
- 天井内塗装 （黒） 階段4吹抜廻り→ｴﾝﾄﾗﾝｽ

1階
- 天井内塗装 （黒） 児童図書ｴﾘｱ
- 天井内設備配管 児童図書ｴﾘｱ
- 天井内設備配管 児童図書ｴﾘｱ
- 天井LGS 児童図書ｴﾘｱ
- 天井LGS 児童図書ｴﾘｱ
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 壁LGS+ﾎﾞｰﾄﾞ張り
- 天井足場盛替え 児童図書ｴﾘｱ
- 天井足場盛替え 児童図書ｴﾘｱ
- 児童図書ｴﾘｱ 15d
- SD取付け 1FSD残搬入 取付順2F→1F
- SD取付け 取付順2F→1F
- ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙﾚｰﾙ取付け ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ
- ﾚｰﾙ廻りLGS ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ
- ﾚｰﾙ廻りﾎﾞｰﾄﾞ ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ
- ﾚｰﾙ廻りﾎﾞｰﾄﾞ塗装 ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ
- AG取付け AG3,4,7搬入
- 取付順3F→2F→1F

B1階
- 塗床 空調機械室，受水槽，電気室 泡消火，排煙機械室1，2
- ｽﾛｰﾌﾟ天井LGS
- ｽﾛｰﾌﾟ天井ｹｲｶﾙ張り
- 外周壁LGS
- 外周壁ｹｲｶﾙ張り
- 外周壁ｹｲｶﾙ張り
- 外周壁LGS
