


月	9月																																																																					
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1									
日	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
	行事予定	全休		安全大会		定例会議				全休								全休								定例会議		全休				定例会議		全休				全休				10月度安全衛生協議会		全休								安全パトロール 総合定例会議				土閉		全休		全休								定例会議		
仮設工事	ディープウェル工事														仮設道路整備														仮設道路整備																																									
揚重機等	SMW重機他														掘削重機(0.7x1~2台)、ガンツ SMW重機他				掘削重機(0.7x1~2台)、ガンツ SMW重機他				掘削重機(0.7x2~4台)、ガンツ SMW重機他				掘削重機(0.7x2~4台)、ガンツ SMW重機他				掘削重機(0.7x2~4台)、ガンツ SMW重機他																																							
山留工事	先行削孔																	錐交換											切梁架け I工区		SMW造成								切梁架け II工区																															
	17重機解体		SMW造成 90m2/d: 3.350m2x35d														構台・棚杭打ち I工区(西→東)				構台・棚杭打ち II工区(東→西)				構台・棚杭打ち III工区(西→東)				錐交換				SMW造成		SMW造成				重機解体		重機解体																													
土留工事	9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1																									
土留工事	汚泥搬出														汚泥搬出				汚泥搬出				汚泥搬出				汚泥搬出				汚泥搬出																																							

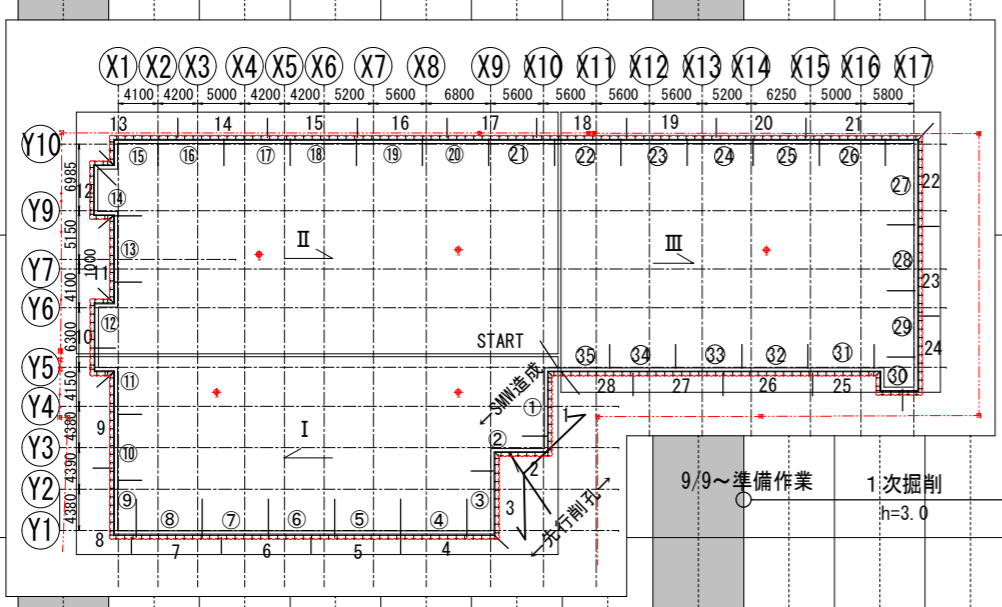

土工事	9/9~準備作業														1次掘削 h=3.0				I工区: 2,580m <sup>3</sup> x8d 8,600m <sup>3</sup> 330m <sup>3</sup> /dx26d				1次掘削 I工区: 2,580m <sup>3</sup> x8d I工区: 3,250m <sup>3</sup> x9d 8,600m <sup>3</sup> 330m <sup>3</sup> /dx26d h=3.0				1次掘削 II工区: 3,250m <sup>3</sup> x9d 8,600m <sup>3</sup> 330m <sup>3</sup> /dx26d h=3.0				2次掘削 I工区: 2,670m <sup>3</sup> x9d 8,900m <sup>3</sup> 300m <sup>3</sup> /dx30d				2次掘削 I工区: 2,670m <sup>3</sup> x9d 8,900m <sup>3</sup> 300m <sup>3</sup> /dx30d				1次掘削 II工区: 3,250m <sup>3</sup> x9d II工区: 3,250m <sup>3</sup> x9d			
検査・立会																																										
施工図																																										
施工計画書																																										
