新小牧市立図書館建設工事のうち建築工事

4月度　月間工程表

No. 09

作成日:2020年 2月21日
修正日:2020年 3月19日

1/1

工期（契約工期）	当該工事工期
着工 : 2019年 7月 5日	2020年 4月 1日
竣工 : 2020年12月25日	2020年 4月30日

鴻池・三喜特定建設工事共同企業体			
監理者	現場代理人	担当者	作成者
	森		森

月：4月

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
AM	○				全休		○					全休		○	○			全休	全休		○					全休		○		○	
PM	○						○							○	○						○			○				○		○	

行事予定：安全大会／定例会議／定例会議／定例会議／安全衛生協議会／定例会議 総合／職長会

仮設工事：
- 外部足場組立 B工区 北面（1日～5日）
- 外部足場組立 C工区 南面（11日～12日）
- 外部足場組立 C工区 北面 ※東面足場架：B1F型枠搬出後（15日～18日）
- 外部足場組立 C工区 東面（20日～22日）
- 外部足場組立 A,A' 工区 南面（23日～26日）
- 外部足場組立 B,B' 工区 北面（28日～30日）

躯体工事 3階：
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 4F、RF all（14日～20日）
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 4F、RF all（20日～21日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL-1,440 C工区（23日～）
- 屋外階段(1) 型枠建込み（27日～）
- 打込配管（28日～）
- 3F下り壁型枠建込（7日～12日）
- 下がり壁配筋 ⑦→⑧（20日～23日）
- 下がり壁型枠返し固め ⑦→⑧ パﾗﾍﾟｯﾄCON 墨出し ⑦ FL-1,440（27日～）
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 3F B' 工区(B-5～9)（9日～10日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL±0 B' 工区（21日～）
- 立上り型枠 打込配管（23日～26日）
- ｽﾗﾌﾞCON B,B' 工区 FL±0（27日～）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL-670 B' 工区（15日～）
- 3F下り壁型枠建込 ⑥（8日～12日）
- 下がり壁配筋 ⑥（13日～）
- 下がり壁型枠返し固め ⑥（16日～）
- パﾗﾍﾟｯﾄCON 墨出し ⑥ FL-670（22日～）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL±0 B工区（14日～）
- 立上り型枠 打込配管（21日～）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 金物取合（25日～26日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL-670 B工区（9日～10日）
- 打込配管（15日～）
- 3F下り壁型枠建込 ④→⑤（4日～7日）
- 下がり壁配筋 ④→⑤（9日～11日）
- 下がり壁型枠返し固め ④→⑤（11日～15日）
- パﾗﾍﾟｯﾄCON ④,⑤ FL-670（17日～18日）
- 墨出し（20日～）
- 手すり金物取付 2F B工区吹抜(=CON止)（20日～23日）
- 3F下り壁型枠建込 ⑨→⑩（27日～）
- 下がり壁配筋 ⑨→⑩（30日～）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL-670 A,A' 工区（1日～3日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL±0 A,A' 工区（3日～4日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 FL±0 A,A' 工区（7日～9日）
- 打込配管 A,A' 工区（9日～11日）
- 立上り型枠 A,A' 工区（16日～）
- ｽﾗﾌﾞCON A,A' 工区 FL±0（20日～21日）
- 躯体工事 4階（27日～）
- 下がり壁配筋 ①→②→③（1日～5日）
- 下がり壁型枠返し固め ①→②→③（7日～12日）
- パﾗﾍﾟｯﾄCON ①,② FL-670（13日～14日）
- パﾗﾍﾟｯﾄCON ③ FL-670（14日～15日）
- 墨出し（15日～16日）
- 手すり金物取付 2F A工区吹抜(=CON止)（16日～17日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 金物取合（17日～18日）
- 4F下り壁型枠建込 ①→②→③（27日～）

2階：
- ﾃﾞｯｷｲﾝｻｰﾄ 2F B' 工区(B-5～9)（8日～9日）
- 手すり金物取付 2Fｽﾛｰﾌﾟ 吹抜共(=CON止)（10日～13日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 2F all（10日～14日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 金物取合（17日～18日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋 ｽﾛｰﾌﾟ鉄筋溶接（20日～21日）
- 打込配管（21日～）
- ｽﾗﾌﾞCON 2F all（22日～23日）
- 1階 腰壁型枠建込み 腰壁打設足場 架け 1,2工区（1日～2日）
- 腰壁配筋 B工区 A工区（2日～3日）
- 腰壁CON B工区（4日～8日）
- 腰壁型枠返し固め（4日～5日）
- ｽﾛｰﾌﾟ側型枠解体（5日～7日）
- ｽﾛｰﾌﾟ型枠建込 西側（7日～10日）
- ｽﾗﾌﾞ配筋（10日～）
- B1F立上配筋・型枠（18日～）
- B1F立上配筋・型枠 B1F天井釘ｶﾚﾝ 3工区 2d（20日～21日）
- B1F立上CON 1,2工区（21日～22日）
- B1F立上CON 3工区 ※ﾌｫｰｸ使用（22日～23日）
- 型枠搬出（27日～28日）

B1階：
- 型枠支保工解体・搬出 (ﾋﾞｯﾄ含む) ※C工区鉄骨建方迄（1日～3日）
- B1F天井釘ｶﾚﾝ 2工区 2d（3日～5日）
- ※ｽﾛｰﾌﾟ使用禁止期間（7日～）
- 型枠支保工解体 (ﾋﾞｯﾄ含む) 3工区（8日～14日）
- 型枠支保工解体・搬出 3工区 (ﾋﾞｯﾄ含む)（14日～18日）
- 型枠搬出 3工区残 (ﾋﾞｯﾄ含む)（23日～26日）
- B1F天井配管（電気・機械工事）（27日～）

鉄骨工事 C工区：
- C-5工区(C30) 鉄骨建方 柱6p 間4p G21p+B36p（13日～14日）
- 建て起し本締め（14日～15日）
- 柱溶接 3F A,A' 工区 柱22p 6dx4p/d（15日～）
- C-3工区(C28) 鉄骨建方 柱3p 間4p G11p+B49p（9日～10日）
- C-4工区(C29) 鉄骨建方 柱5p 間6p G12p+B37p（10日～11日）
- 建て起し本締め（13日～14日）
- C-2工区(C27) 鉄骨建方 柱5p 間13p G13p+B39p V4（8日～9日）
- 建て起し本締め（9日～10日）
- ｽﾀｯﾄﾞ溶接 2,3,4,RF C工区（14日～15日）
- C-1工区(C26) 鉄骨建方 柱9p 間10p G26p+B51p（4日～5日）
- ﾃﾞｯｷ搬入（5日～6日）
- ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰｽ搬入 C-1工区2,3,4,RF C工区（5日～6日）
- 柱溶接 1F C-1～5工区(1C26～1C30) 柱20p 4dx6p/d（13日～15日）
- ﾃﾞｯｷ搬入（8日～9日）
- C-2工区2,3,4F
- ﾃﾞｯｷ搬入（9日～10日）
- C-3工区2,3F
- ﾃﾞｯｷ敷込（10日～11日）
- ﾃﾞｯｷ搬入 C-1,2,3,4工区2F,3F,4F,RF
- C-4工区2,3F
- C-5工区2,3F
- ﾃﾞｯｷ敷込（14日～15日）
- C-5工区2F,3F

B工区：
- B-8,9工区(2B25) 鉄骨建方 柱23p G41p+B47p V2（1日～3日）
- 建て起し本締め（3日～4日）
- ｽﾀｯﾄﾞ溶接 RF A-1～4工区（4日～7日）
- ｽﾀｯﾄﾞ溶接 2F B-5～9工区（7日～8日）
- ｽﾀｯﾄﾞ溶接 3F B-5～9工区（10日～11日）
- ｽﾀｯﾄﾞ溶接 4F B-5～9工区（11日～12日）
- ｽﾀｯﾄﾞ溶接 RF B-5～9工区（13日～14日）
- 階段(4) 3～4F（3日～4日）
- 柱溶接 1F B-5～9工区(1B13～1B17) 柱18p 4dx6p/d（8日～9日）
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-5,6,7,8,9工区2F（4日～5日）
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-5,6,7,8,9工区3F（5日～8日）
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-5,6,7,8,9工区4F（8日～10日）
- ﾃﾞｯｷ敷込 B-5,6,7,8,9工区RF（10日～11日）

柱溶接 3F A,A' 工区 柱22p 6dx4p/d（20日～23日）
柱溶接 3F B,B' 工区 柱29p 7dx4p/d（24日～26日）
柱溶接 3F C工区 柱6p 1dx6p/d（30日～）

※東面足場架

検査・立会
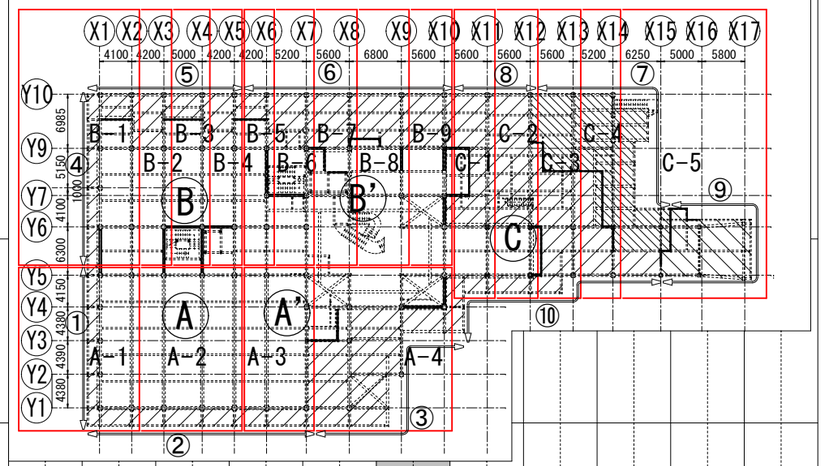
施工図
施工計画書
